


リフト図

○基本情報

発注者(事務所名)	安中土木事務所	受注者	安中土建株式会社	
路線・河川・地区等	(一) 下里見安中線	工期	2019/06/21	~ 2020/06/30
工事名	補助公共 社会資本総合整備 (活力・重点) 市道1344号線ボックスカルバート工事	工区	安中	
施工場所	西毛広域幹線道路安中工区	緯度	36°19'48"	経度 138°53'09"
構造物名	ボックスカルバート			
構造物詳細	①ブロック 底版部	リフト名	2リフト①	

打込みリフト図

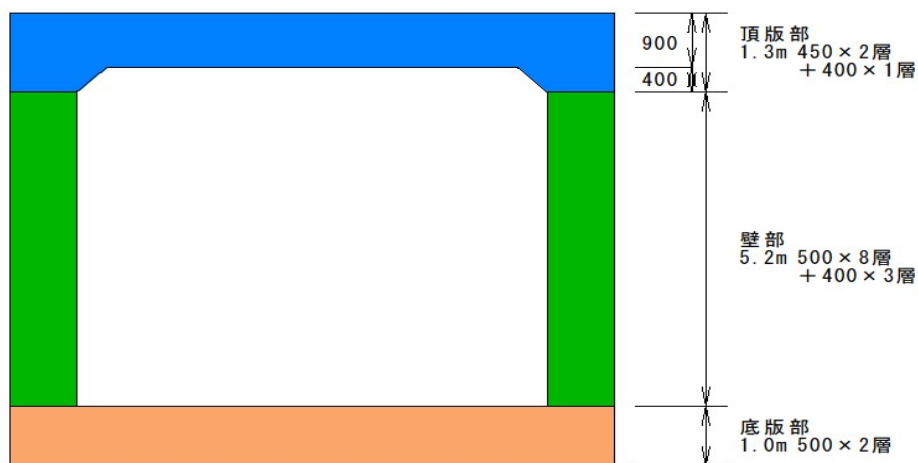

○構造

構造物種類	ボックスカルバート
構造形式	RC構造
打込み部位	底版

○寸法

厚さ	9.340 m
長さ(幅)	8.10 m

○配筋

主鉄筋	前面	D32 @250
	背面	D32 @250
配力筋	前面	D32 @250
	背面	D32 @250
設計純かぶり		
申し送り 事項		

○ひび割れ抑制対策

補強鉄筋	
配筋状況(タイプA)	
タイプA段数	段
配筋状況(タイプB)	
誘発目地間隔	m
膨張材	kg/m ³
その他の対策	

○鉄筋比

鉄筋比(対策前)	0.654 %
鉄筋比(実施)	%

リフトID 007-005-02

コンクリート打込み管理表

○基本情報

路線・河川・地区等	(一) 下里見安中線	工期	2019/06/21	～	2020/06/30
工事名	補助公共 社会資本総合整備 (活力・重点) 市道1344号線ボックスカルバート工事			工区	安中
構造物名	ボックスカルバート				
構造物詳細	①ブロック 底版部	リフト名	2リフト①		

○コンクリート

材料・配合	呼び強度	27 N/mm ²	スラブ	12 cm	骨材最大寸法	20 mm
	水セメント比	55 %	単位体積重量	314 kg/m ³		
	セメント種類	高炉B種	セメント会社	太平洋セメント株式会社		
	混和剤	AE減水剤	混和材	---		
	生コン工場	北関東秩父コンクリート株式会社 安中工場				
品質管理試験	試料採取時期	打込み開始時	150m ³ 打込み時又は午後		300m ³ 打込み時	試験許容値
	スラブ	12.0 cm	13.5 cm	cm		±2.5
	空気量	3.4 %	3.7 %	%		±1.5
	塩化物イオン量	0.030 kg/m ³	0.030 kg/m ³	kg/m ³		0.3 kg/m ³ 以下
	コンクリート温度	18.0 °C	23.0 °C	°C		
	打込み時外気温	10.7 °C	18.5 °C	°C		
	7日強度	18.8 N/mm ²	18.3 N/mm ²	N/mm ²		
	28日強度	33.9 N/mm ²	33.3 N/mm ²	N/mm ²		

○運搬・打込み・締固め

打込み日	2019/10/30		天気	晴れ	下側リフト打込み日	
型枠種類	木製型枠		下側リフト打継目処理			
運搬	現場までの運搬時間	15 分	現場待機時間	3 分	荷卸し時間	5 分/台
	現場内運搬方法	ポンプ (配管なし)	ポンプ圧送距離	10 m	ポンプ車台数	1 台
打込み	開始時刻	10:20	終了時刻	12:50		
	リフト高	1.0 m	打込み量	76.0 m ³	打込み速度	0.4 m/h
締固め	バイレタ台数	3 台	バイレタ人数	3 人	バイレタ予備	1 台
	ホース筒先	2 人				

○コンクリート温度履歴

初期温度	24.3 °C	最高温度	32.3 °C	温度上昇量	8.0 °C
最高温度に到達した時間	28 時間後				

○養生

脱型日	2020/01/24		残置期間	86	日
養生方法	型枠面	ブルーシート			
	打込み面	養生マット・ブルーシート			
養生 (湿潤状態) 期間	7	日			

コンクリート打込み管理表（温度計測その1）

○基本情報

路線・河川・地区等	(一) 下里見安中線	工期	2019/06/21	～	2020/06/30
工事名	補助公共 社会資本総合整備（活力・重点）市道1344号線ボックスカルバート工事	工区	安中		
構造物名	ボックスカルバート				
構造物詳細	①ブロック 底版部	リフト名	2リフト①		

日時	天気	計測時刻	コンクリート温度	外気温	備考
2019/10/30 (水)	朝	08:00	℃	10.7℃	
	昼				
	夕	17:00	24.3	17.4	
2019/10/31 (木)	朝	08:00	30.5℃	14.1℃	
	昼	13:00	32.0℃	18.6℃	
	夕	17:00	32.3℃	16.3℃	
2019/11/01 (金)	朝	08:00	28.6℃	10.4℃	
	昼	13:00	30.3℃	24.1℃	
	夕	17:00	31.7℃	19.0℃	
2019/11/02 (土)	朝	08:00	25.7℃	10.1℃	
	昼	13:00	26.5℃	18.1℃	
	夕	17:00	26.9℃	14.6℃	
2019/11/03 (日)	朝		℃	℃	
	昼		℃	℃	
	夕		℃	℃	
2019/11/04 (月)	朝		℃	℃	
	昼		℃	℃	
	夕		℃	℃	
2019/11/05 (火)	朝	08:00	17.8℃	9.9℃	
	昼	13:00	18.7℃	16.8℃	
	夕	17:00	19.6℃	13.0℃	
2019/11/06 (水)	朝	08:00	15.4℃	8.4℃	
	昼	13:00	17.2℃	19.2℃	
	夕	17:00	18.0℃	14.0℃	
2019/11/07 (木)	朝	08:00	14.7℃	8.9℃	
	昼	13:00	16.1℃	17.0℃	
	夕	17:00	17.0℃	13.5℃	
2019/11/08 (金)	朝	08:00	14.7℃	9.2℃	
	昼	13:00	15.7℃	15.9℃	
	夕	17:00	16.4℃	12.3℃	
2019/11/09 (土)	朝	08:00	14.4℃	8.0℃	
	昼	13:00	15.0℃	15.9℃	
	夕	17:00	15.6℃	12.0℃	
2019/11/10 (日)	朝		℃	℃	
	昼		℃	℃	
	夕		℃	℃	
2019/11/11 (月)	朝	08:00	14.6℃	11.2℃	
	昼	13:00	15.3℃	15.7℃	
	夕	17:00	15.5℃	12.2℃	
2019/11/12 (火)	朝	08:00	12.7℃	9.7℃	
	昼	13:00	14.9℃	16.6℃	
	夕	17:00	14.6℃	12.4℃	
2019/11/13	朝	08:00	11.5℃	5.8℃	
	昼	13:00	12.3℃	14.8℃	
	夕	17:00	13.3℃	12.4℃	
2019/11/14 (木)	朝	08:00	11.6℃	8.1℃	
	昼	13:00	13.8℃	19.0℃	
	夕	17:00	14.6℃	13.7℃	
2019/11/15 (金)	朝	08:00	11.1℃	6.2℃	
	昼	13:00	11.8℃	13.5℃	
	夕	17:00	12.4℃	10.2℃	
2019/11/16 (土)	朝	08:00	9.4℃	4.5℃	
	昼	13:00	11.4℃	17.1℃	
	夕	17:00	10.3℃	13.6℃	


コンクリート打込み管理表 (温度計測その2)

○基本情報

路線・河川・地区等	(一) 下里見安中線	工期	2019/06/21	~	2020/06/30
工事名	補助公共 社会資本総合整備 (活力・重点) 市道1344号線ボックスカルバート工事	工区	安中		
構造物名	ボックスカルバート				
構造物詳細	①ブロック 底版部	リフト名	2リフト①		

日時	天気	計測時刻	コンクリート温度	外気温	備考
2019/11/17 (日)	朝		°C	°C	
	昼		°C	°C	
	夕		°C	°C	
2019/11/18 (月)	朝	晴れ 08:00	9.9 °C	5.4 °C	
	昼	晴れ 13:00	11.2 °C	18.0 °C	
	夕	晴れ 17:00	11.9 °C	14.4 °C	
2019/11/19 (火)	朝	晴れ 08:00	12.6 °C	12.7 °C	
	昼	晴れ 13:00	13.4 °C	17.4 °C	
	夕	晴れ 17:00	13.0 °C	15.1 °C	
2019/11/20 (水)	朝	晴れ 08:00	9.8 °C	5.3 °C	
	昼	晴れ 13:00	10.5 °C	11.3 °C	
	夕	晴れ 17:00	10.7 °C	9.3 °C	
2019/11/21 (木)	朝	晴れ 08:00	8.2 °C	4.8 °C	
	昼	晴れ 13:00	9.1 °C	12.0 °C	
	夕	晴れ 17:00	9.8 °C	8.6 °C	
2019/11/22 (金)	朝	曇り 08:00	6.9 °C	2.0 °C	
	昼	雨 13:00	12.3 °C	9.3 °C	
	夕	雨 17:00	10.7 °C	10.8 °C	
2019/11/23 (土)	朝		°C	°C	
	昼		°C	°C	
	夕		°C	°C	
2019/11/24 (日)	朝		°C	°C	
	昼		°C	°C	
	夕		°C	°C	
2019/11/25 (月)	朝	晴れ 08:00	13.5 °C	12.2 °C	
	昼	晴れ 13:00	14.1 °C	19.3 °C	
	夕	晴れ 17:00	14.4 °C	14.3 °C	
2019/11/26 (火)	朝	曇り 08:00	12.1 °C	8.6 °C	
	昼	曇り 13:00	11.8 °C	9.6 °C	
	夕	曇り 17:00	11.6 °C	8.7 °C	

コンクリート温度・外気温計測結果

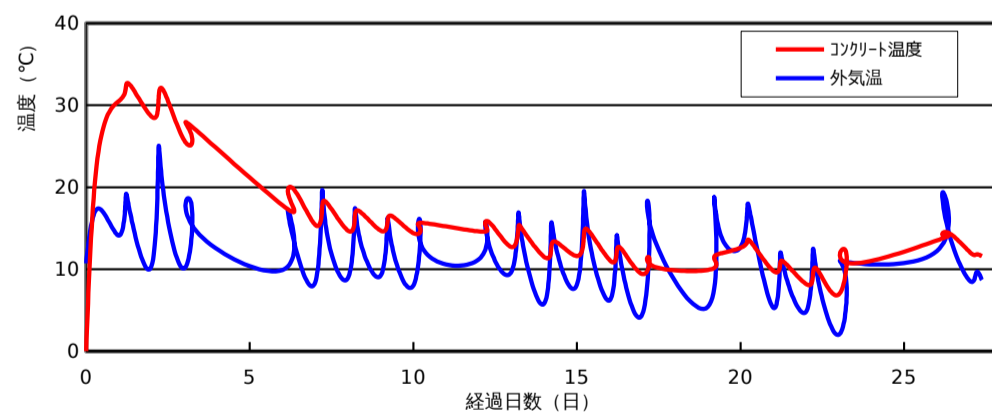

ひび割れ調査票 (その1)

○基本情報

路線・河川・地区等	(一) 下里見安中線	工期	2019/06/21	~	2020/06/30
工事名	補助公共 社会資本総合整備 (活力・重点) 市道1344号線ボックスカルバート工事			工区	安中
構造物名	ボックスカルバート				
構造物詳細	①ブロック 底版部	リフト名	2リフト①		

○ひび割れの有無

ひび割れの有無	無
---------	---

○ひび割れ概要

ひび割れ調査票 (その2)

○基本情報

路線・河川・地区等	(一) 下里見安中線	工期	2019/06/21	~	2020/06/30
工事名	補助公共 社会資本総合整備 (活力・重点) 市道1344号線ボックスカルバート工事	工区	安中		
構造物名	ボックスカルバート				
構造物詳細	①ブロック 底版部	リフト名	2リフト①		

○ひび割れ状況

ひび割れ	No.	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11
	位置											
	形状											
	方向											
調査日	2020/01/24											
	2020/01/31											
	2020/02/07											
	2020/02/14											
	2020/02/21											
	備考											
補修	補修の有無											
	補修日											
	補修方法											
	備考											

設計，施工対比確認表（その1）

○基本情報

路線・河川・地区等	(一) 下里見安中線	工期	2019/06/21	～	2020/06/30
工事名	補助公共 社会資本総合整備（活力・重点）市道1344号線ボックスカルバート工事	工区	安中		
構造物名	ボックスカルバート				
構造物詳細	①ブロック 底版部	リフト名	2リフト①		

○確実な充填

項目	設計	施工	備考
最小鉄筋間隔	mm	mm	打込みに影響するもの
最小スランブ	cm	cm	設計値/想定値
発注スランブ	cm	cm	設計値/実際
流動化剤の後添加有無		無	
打込み時の一時鉄筋移動		無	
コンクリートの施工性		良好	施工者の評価
初期欠陥の有無/程度	豆板	無	有無/程度
	コールドジョイント	無	
	沈みひび割れ	無	
補修の有無/方法		無	有無/方法

○ひび割れ抑制

項目	設計	施工	備考
温度ひび割れ検討			対象/対象外
温度ひび割れ幅の限界値	mm	mm	
照査方法			
条件	打込み時期		
	打込み温度		
	外気温		
	リフト高	m	1.000 m
	セメントの種類		高炉B種
	断熱温度上昇特性		
結果	ひび割れ指数		
	最大ひび割れ幅	mm	mm
	最高温度	℃	32.3℃
	ひび割れ抑制対策		
	補修の有無/方法		無

○かぶり（厚さ）の確保

項目	設計	施工	備考
最小かぶり ^{※1}	mm	mm	
誤差の想定値 ^{※2}	mm	mm	

※1：施工は非破壊試験による実測値

※2：施工は非破壊試験の測定誤差の想定値

設計，施工対比確認表（その2）

○基本情報

路線・河川・地区等	(一) 下里見安中線	工期	2019/06/21	～	2020/06/30
工事名	補助公共 社会資本総合整備 (活力・重点) 市道1344号線ボックスカルバート工事	工区	安中		
構造物名	ボックスカルバート				
構造物詳細	①ブロック 底版部	リフト名	2リフト①		

○密実性確保

項目	設計	施工	備考
環境条件			
セメントの種類		高炉B種	
水セメント比		53.50%	
空気量	%	3.4%	
養生方法		シート・マット	

○排水・防水対策

項目	設計	施工	備考
防水対策の有無		無	
セメントの種類		高炉B種	
