


リフト図

○基本情報

発注者(事務所名)	安中土木事務所	受注者	安中土建株式会社		
路線・河川・地区等	(一) 下里見安中線	工期	2019/06/21	~ 2020/06/30	
工事名	補助公共 社会資本総合整備 (活力・重点) 市道1344号線ボックスカルバート工事	工区	安中		
施工場所	西毛広域幹線道路安中工区	緯度	36°19'48"	経度	138°53'09"
構造物名	ボックスカルバート				
構造物詳細	左口翼壁	リフト名	10リフト		

打込みリフト図

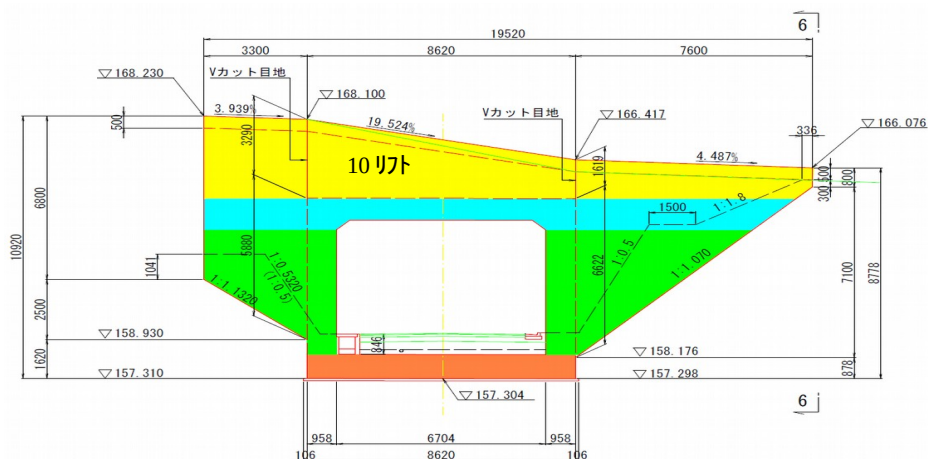

○構造

構造物種類	ボックスカルバート
構造形式	RC構造
打込み部位	胸壁

○寸法

厚さ	0.800 m
長さ(幅)	19.52 m

○配筋

主鉄筋	前面	D19 @250
	背面	D29 @125
配力筋	前面	D19 @250
	背面	D29 @125

設計純かぶり

申し送り事項

○ひび割れ抑制対策

補強鉄筋	
配筋状況(タイプA)	
タイプA段数	段
配筋状況(タイプB)	
誘発目地間隔	m
膨張材	kg/m ³
その他の対策	

○鉄筋比

鉄筋比(対策前)	0.814 %
鉄筋比(実施)	%

リフトID 007-005-12

コンクリート打込み管理表

○基本情報

路線・河川・地区等	(一) 下里見安中線	工期	2019/06/21	～	2020/06/30
工事名	補助公共 社会資本総合整備 (活力・重点) 市道1344号線ボックスカルバート工事			工区	安中
構造物名	ボックスカルバート				
構造物詳細	左口翼壁	リフト名	10リフト		

○コンクリート

材料・配合	呼び強度	27 N/mm ²	スラブ	12 cm	骨材最大寸法	20 mm
	水セメント比	55 %	単位体積重量	314 kg/m ³		
	セメント種類	高炉B種	セメント会社	太平洋セメント株式会社		
	混和剤	AE減水剤	混和材	---		
	生コン工場	北関東秩父コンクリート株式会社 安中工場				
品質管理試験	試料採取時期	打込み開始時	150m ³ 打込み時又は午後	300m ³ 打込み時	試験許容値	
	スラブ	12.5 cm	cm	cm		
	空気量	4.0 %	%	%		
	塩化物イオン量	0.040 kg/m ³	kg/m ³	kg/m ³	kg/m ³ 以下	
	コンクリート温度	16.0 °C	°C	°C		
	打込み時外気温	8.0 °C	°C	°C		
	7日強度	17.1 N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	
	28日強度	32.4 N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	

○運搬・打込み・締固め

打込み日	2020/03/11		天気	晴れ	下側リフト打込み日	2020/03/02
型枠種類	木製型枠		下側リフト打継目処理	コンクリート打継目処理剤		
運搬	現場までの運搬時間	15 分	現場待機時間	15 分	荷卸し時間	15 分/台
	現場内運搬方法	ポンプ (配管なし)	ポンプ圧送距離	15 m	ポンプ車台数	1 台
打込み	開始時刻	07:30	終了時刻	11:00		
	リフト高	2.7 m	打込み量	34.5 m ³	打込み速度	0.8 m/h
締固め	バイブレータ台数	3 台	バイブレータ人数	3 人	バイブレータ予備	1 台
	ホース筒先	2 人				

○コンクリート温度履歴

初期温度	26.8 °C	最高温度	28.4 °C	温度上昇量	1.6 °C
最高温度に到達した時間	30 時間後				

○養生

脱型日	2020/04/01		残置期間	21	日
養生方法	型枠面	シート・マット			
	打込み面	シート・マット			
養生 (湿潤状態) 期間	21	日			

コンクリート打込み管理表 (温度計測その1)

○基本情報

路線・河川・地区等	(一) 下里見安中線	工期	2019/06/21	～	2020/06/30
工事名	補助公共 社会資本総合整備 (活力・重点) 市道1344号線ボックスカルバート工事	工区	安中		
構造物名	ボックスカルバート				
構造物詳細	左口翼壁	リフト名	10リフト		

日時	天気	計測時刻	コンクリート温度	外気温	備考
2020/03/11 (水)	朝		℃	℃	
	昼				
	夕				
2020/03/12 (木)	朝	晴れ	08:00	26.8℃	8.7℃
	昼	晴れ	13:00	27.4℃	15.5℃
	夕	晴れ	17:00	28.4℃	12.6℃
2020/03/13 (金)	朝	晴れ	08:00	27.7℃	8.1℃
	昼	晴れ	13:00	27.6℃	17.3℃
	夕	曇り	17:00	28.1℃	16.0℃
2020/03/14 (土)	朝	雨	08:00	24.8℃	7.8℃
	昼	雨	13:00	23.7℃	5.3℃
	夕	雨	17:00	23.5℃	5.1℃
2020/03/15 (日)	朝			℃	℃
	昼			℃	℃
	夕			℃	℃
2020/03/16 (月)	朝	晴れ	08:00	15.1℃	6.8℃
	昼	晴れ	13:00	14.8℃	11.3℃
	夕	晴れ	17:00	14.0℃	10.1℃
2020/03/17 (火)	朝	晴れ	08:00	9.8℃	6.2℃
	昼	晴れ	13:00	10.6℃	13.8℃
	夕	晴れ	17:00	12.2℃	18.3℃
2020/03/18 (水)	朝	晴れ	08:00	9.9℃	8.3℃
	昼	晴れ	13:00	11.8℃	16.4℃
	夕	晴れ	17:00	13.0℃	16.1℃
2020/03/19 (木)	朝	晴れ	08:00	9.9℃	6.9℃
	昼	晴れ	13:00	11.6℃	18.0℃
	夕	晴れ	17:00	13.3℃	18.0℃
2020/03/20 (金)	朝			℃	℃
	昼			℃	℃
	夕			℃	℃
2020/03/21 (土)	朝	晴れ	08:00	10.0℃	7.0℃
	昼	晴れ	13:00	11.7℃	18.8℃
	夕	晴れ	17:00	13.3℃	20.2℃
2020/03/22 (日)	朝			℃	℃
	昼			℃	℃
	夕			℃	℃
2020/03/23 (月)	朝	晴れ	08:00	12.1℃	10.1℃
	昼	晴れ	13:00	13.4℃	14.0℃
	夕	晴れ	17:00	13.7℃	12.9℃
2020/03/24 (火)	朝	晴れ	08:00	10.2℃	6.0℃
	昼	晴れ	13:00	10.6℃	13.8℃
	夕	晴れ	17:00	11.0℃	10.7℃
2020/03/25	朝	晴れ	08:00	10.8℃	13.5℃
	昼	晴れ	13:00	12.1℃	16.3℃
	夕	晴れ	17:00	11.6℃	12.7℃
2020/03/26 (木)	朝	晴れ	08:00	10.6℃	13.5℃
	昼	晴れ	13:00	11.9℃	17.3℃
	夕	晴れ	17:00	10.7℃	13.7℃
2020/03/27 (金)	朝	晴れ	08:00	10.1℃	12.5℃
	昼	晴れ	13:00	12.0℃	19.2℃
	夕	晴れ	17:00	10.5℃	14.3℃
2020/03/28 (土)	朝	晴れ	08:00	11.3℃	19.0℃
	昼	晴れ	13:00	12.2℃	19.6℃
	夕	晴れ	17:00	11.4℃	17.0℃


コンクリート打込み管理表 (温度計測その2)

○基本情報

路線・河川・地区等	(一) 下里見安中線	工期	2019/06/21	~	2020/06/30
工事名	補助公共 社会資本総合整備 (活力・重点) 市道1344号線ボックスカルバート工事	工区	安中		
構造物名	ボックスカルバート				
構造物詳細	左口翼壁	リフト名	10リフト		

日時	天気	計測時刻	コンクリート温度	外気温	備考
2020/03/29 (日)	朝		°C	°C	
	昼		°C	°C	
	夕		°C	°C	
2020/03/30 (月)	朝	晴れ 08:00	10.3 °C	11.1 °C	
	昼	晴れ 13:00	10.7 °C	15.8 °C	
	夕	晴れ 17:00	10.4 °C	14.6 °C	
2020/03/31 (火)	朝	晴れ 08:00	9.9 °C	10.4 °C	
	昼	晴れ 13:00	10.9 °C	16.8 °C	
	夕	晴れ 17:00	10.2 °C	15.3 °C	
2020/04/01 (水)	朝	晴れ 08:00	8.5 °C	9.1 °C	
	昼	晴れ 13:00	10.5 °C	18.7 °C	
	夕	晴れ 17:00	10.1 °C	16.9 °C	
2020/04/02 (木)	朝	晴れ 08:00	9.1 °C	9.5 °C	
	昼	晴れ 13:00	12.3 °C	19.1 °C	
	夕	晴れ 17:00	12.0 °C	18.0 °C	
2020/04/03 (金)	朝	晴れ 08:00	8.1 °C	8.6 °C	
	昼	晴れ 13:00	11.9 °C	17.5 °C	
	夕	晴れ 17:00	11.6 °C	15.8 °C	
2020/04/04 (土)	朝	晴れ 08:00	9.7 °C	12.0 °C	
	昼	晴れ 13:00	12.2 °C	19.0 °C	
	夕	晴れ 17:00	11.6 °C	14.8 °C	
2020/04/05 (日)	朝		°C	°C	
	昼		°C	°C	
	夕		°C	°C	
2020/04/06 (月)	朝	晴れ 08:00	9.9 °C	11.0 °C	
	昼	晴れ 13:00	11.7 °C	17.9 °C	
	夕	晴れ 17:00	11.5 °C	15.3 °C	
2020/04/07 (火)	朝	晴れ 08:00	10.5 °C	13.6 °C	
	昼	晴れ 13:00	12.1 °C	19.4 °C	
	夕	晴れ 17:00	11.3 °C	16.2 °C	

コンクリート温度・外気温計測結果

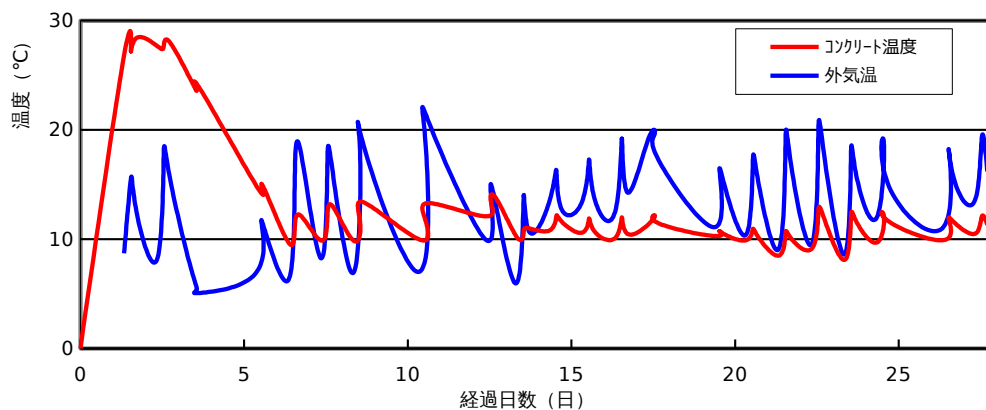

ひび割れ調査票 (その1)

○基本情報

路線・河川・地区等	(一) 下里見安中線	工期	2019/06/21	~	2020/06/30
工事名	補助公共 社会資本総合整備 (活力・重点) 市道1344号線ボックスカルバート工事			工区	安中
構造物名	ボックスカルバート				
構造物詳細	左口翼壁	リフト名	10リフト		

○ひび割れの有無

ひび割れの有無	無
---------	---

○ひび割れ概要

ひび割れ調査票 (その2)

○基本情報

路線・河川・地区等	(一) 下里見安中線	工期	2019/06/21	~	2020/06/30
工事名	補助公共 社会資本総合整備 (活力・重点) 市道1344号線ボックスカルバート工事	工区	安中		
構造物名	ボックスカルバート				
構造物詳細	左口翼壁	リフト名	10リフト		

○ひび割れ状況

ひび割れ	No.	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11
	位置											
	形状											
	方向											
調査日	2020/04/01											
	2020/04/08											
	2020/04/15											
	2020/04/22											
	2020/05/07											
	備考											
補修	補修の有無											
	補修日											
	補修方法											
	備考											

設計，施工対比確認表（その1）

○基本情報

路線・河川・地区等	(一) 下里見安中線	工期	2019/06/21	～	2020/06/30
工事名	補助公共 社会資本総合整備（活力・重点）市道1344号線ボックスカルバート工事	工区	安中		
構造物名	ボックスカルバート				
構造物詳細	左口翼壁	リフト名	10リフト		

○確実な充填

項目	設計	施工	備考
最小鉄筋間隔	mm	mm	打込みに影響するもの
最小スランブ	cm	cm	設計値/想定値
発注スランブ	cm	cm	設計値/実際
流動化剤の後添加有無		無	
打込み時の一時鉄筋移動		無	
コンクリートの施工性		やや難	施工者の評価
初期欠陥の有無/程度	豆板	無	有無/程度
	コールドジョイント	無	
	沈みひび割れ	無	
補修の有無/方法		無	有無/方法

○ひび割れ抑制

項目	設計	施工	備考
温度ひび割れ検討			対象/対象外
温度ひび割れ幅の限界値	mm	mm	
照査方法			
条件	打込み時期		
	打込み温度		
	外気温		
	リフト高	m	2.700 m
	セメントの種類		高炉B種
	断熱温度上昇特性		
結果	ひび割れ指数		
	最大ひび割れ幅	mm	mm
	最高温度	°C	°C
	ひび割れ抑制対策		
	補修の有無/方法		無

○かぶり（厚さ）の確保

項目	設計	施工	備考
最小かぶり ^{※1}	mm	mm	
誤差の想定値 ^{※2}	mm	mm	

※1：施工は非破壊試験による実測値

※2：施工は非破壊試験の測定誤差の想定値

設計，施工対比確認表（その2）

○基本情報

路線・河川・地区等	(一) 下里見安中線	工期	2019/06/21	～	2020/06/30
工事名	補助公共 社会資本総合整備 (活力・重点) 市道1344号線ボックスカルバート工事	工区	安中		
構造物名	ボックスカルバート				
構造物詳細	左口翼壁	リフト名	10リフト		

○密実性確保

項目	設計	施工	備考
環境条件			
セメントの種類		高炉B種	
水セメント比		53.5	
空気量	%	4.0%	
養生方法		シート・マット	

○排水・防水対策

項目	設計	施工	備考
防水対策の有無			
セメントの種類		高炉B種	
