


リフト図

○基本情報

発注者(事務所名)	高崎土木事務所	受注者	株式会社 千代田組	
路線・河川・地区等	主要地方道 前橋安中富岡線	工期	2020/02/01	~ 2021/02/26
工事名	社会資本総合整備(活力・重点)(分割19号)(仮称)さくら通り橋梁A1工事		工区	
施工場所	高崎市 上大島町地内	緯度	36°21'40"	経度 138°55'45"
構造物名	さくら橋梁			
構造物詳細	A1橋台	リフト名	2リフト目	

打込みリフト図

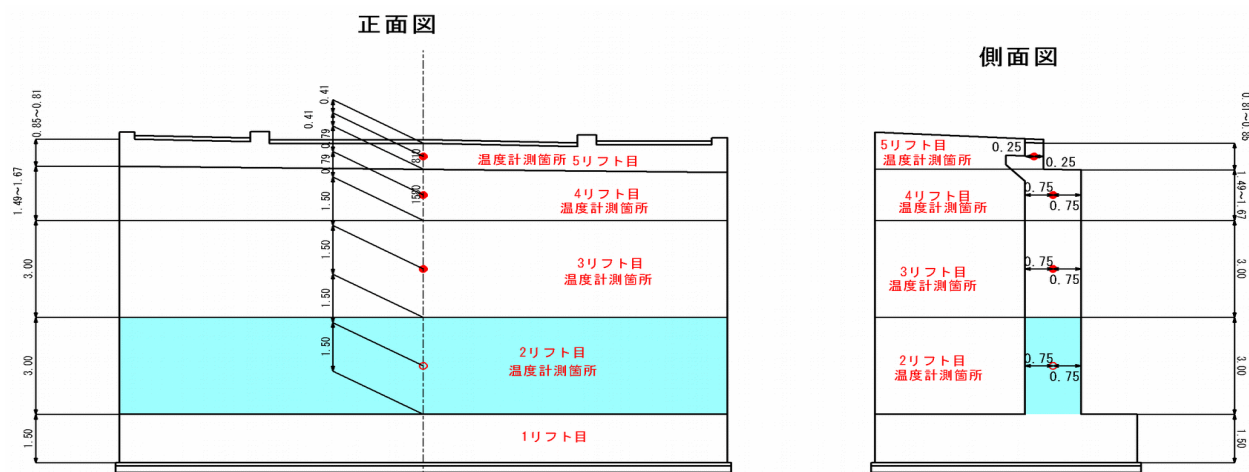

○構造

構造物種類	橋台
構造形式	RC構造
打込み部位	たて壁

○寸法

厚さ	1.500 m
長さ(幅)	16.22 m

○配筋

主鉄筋	前面	D25 @250
	背面	D32 @250
配力筋	前面	D16 @250
	背面	D19 @250
設計純かぶり		121.5
申し送り事項		

○ひび割れ抑制対策

補強鉄筋	タイプA
配筋状況(タイプA)	D16 @125
タイプA段数	6段
配筋状況(タイプB)	
誘発目地間隔	m
膨張材	kg/m <sup>3</sup>
その他の対策	

○鉄筋比

鉄筋比(対策前)	0.129 %
鉄筋比(実施)	0.341 %

リフトID	004-010-02
-------	------------

## コンクリート打込み管理表

## ○基本情報

路線・河川・地区等	主要地方道 前橋安中富岡線	工期	2020/02/01	～	2021/02/26
工事名	社会資本総合整備（活力・重点）（分割19号）（仮称）さくら通り橋梁A1工事			工区	
構造物名	さくら橋梁				
構造物詳細	A1橋台	リフト名	2リフト目		

## ○コンクリート

材料・配合	呼び強度	27 N/mm <sup>2</sup>	スランプ	12 cm	骨材最大寸法	20 mm
	水セメント比	54 %	単位セメント量	316 kg/m <sup>3</sup>		
	セメント種類	高炉B種	セメント会社	太平洋セメント株式会社		
	混和剤	AE減水剤	混和材			
	生コン工場	北関東秩父コンクリート株式会社 箕郷工場				
品質管理試験	試料採取時期	打込み開始時	150m <sup>3</sup> 打込み時又は午後	300m <sup>3</sup> 打込み時	試験許容値	
	スランプ	13.0 cm	cm	cm		
	空気量	4.8 %	%	%		
	塩化物イオン量	0.030 kg/m <sup>3</sup>	kg/m <sup>3</sup>	kg/m <sup>3</sup>	kg/m <sup>3</sup>	kg/m <sup>3</sup> 以下
	コンクリート温度	25.0 °C	°C	°C		
	打込み時外気温	18.5 °C	°C	°C		
	7日強度	18.8 N/mm <sup>2</sup>	N/mm <sup>2</sup>	N/mm <sup>2</sup>	N/mm <sup>2</sup>	
	28日強度	33.2 N/mm <sup>2</sup>	N/mm <sup>2</sup>	N/mm <sup>2</sup>	N/mm <sup>2</sup>	

## ○運搬・打込み・締固め

打込み日	2020/10/01		天気	曇り	下側ワ打込み日	2020/07/07
型枠種類	鋼製型枠		下側ワ打継目処理	処理剤（ジョイントテックスCT-400）		
運搬	現場までの運搬時間	20 分	現場待機時間	20 分	荷卸し時間	5 分/台
	現場内運搬方法	ポンプ（配管なし）	ポンプ圧送距離	0 m	ポンプ車台数	1 台
打込み	開始時刻	08:45	終了時刻	13:30		
	リフト高	3.0 m	打込み量	93.0 m <sup>3</sup>	打込み速度	0.5 m/h
締固め	ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ台数	4 台	ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ人数	8 人	ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ予備	2 台
	ホース筒先	1 人				

## ○コンクリート温度履歴

初期温度	30.1 °C	最高温度	62.9 °C	温度上昇量	32.8 °C
最高温度に到達した時間	46 時間後				

## ○養生

脱型日	2020/12/10		残置期間	70 日
養生方法	型枠面	型枠		
	打込み面	ブルーシート		
養生（湿潤状態）期間	3 日			

## コンクリート打込み管理表 (温度計測その1)

## ○基本情報

路線・河川・地区等	主要地方道 前橋安中富岡線	工期	2020/02/01	～	2021/02/26
工事名	社会資本総合整備 (活力・重点) (分割19号) (仮称) さくら通り橋梁A1工事			工区	
構造物名	さくら橋梁				
構造物詳細	A1橋台	リフト名	2リフト目		

日時	天気	計測時刻	コンクリート温度	養生温度	備考
2020/10/01 (木)	曇り	15:00	30.1 °C	25.8 °C	
2020/10/02 (金)	朝	08:00	54.9 °C	17.7 °C	
	昼	13:00	58.3 °C	28.6 °C	
	夕	17:00	60.2 °C	24.4 °C	
2020/10/03 (土)	朝	08:00	62.6 °C	20.3 °C	
	昼	13:00	62.9 °C	24.5 °C	
	夕	17:00	62.6 °C	22.5 °C	
2020/10/04 (日)	朝	08:00	60.2 °C	17.9 °C	
	昼	13:00	59.7 °C	23.7 °C	
	夕	17:00	59.0 °C	21.8 °C	
2020/10/05 (月)	朝	08:00	55.8 °C	17.7 °C	
	昼	13:00	54.6 °C	23.8 °C	
	夕	17:00	53.8 °C	23.0 °C	
2020/10/06 (火)	朝	08:00	50.4 °C	14.6 °C	
	昼	13:00	49.6 °C	21.7 °C	
	夕	17:00	48.7 °C	20.0 °C	
2020/10/07 (水)	朝	08:00	45.4 °C	16.7 °C	
	昼	13:00	44.6 °C	24.1 °C	
	夕	17:00	43.8 °C	17.6 °C	
2020/10/08 (木)	朝	08:00	40.7 °C	14.0 °C	
	昼	13:00	39.9 °C	16.3 °C	
	夕	17:00	39.2 °C	15.5 °C	
2020/10/09 (金)	朝	08:00	36.9 °C	14.5 °C	
	昼	13:00	35.7 °C	14.3 °C	
	夕	17:00	35.2 °C	14.2 °C	
2020/10/10 (土)	朝	08:00	32.3 °C	14.5 °C	
	昼	13:00	31.8 °C	16.3 °C	
	夕	17:00	31.2 °C	16.7 °C	
2020/10/11 (日)	朝	08:00	29.3 °C	17.9 °C	
	昼	13:00	28.9 °C	26.0 °C	
	夕	17:00	28.6 °C	24.3 °C	
2020/10/12 (月)	朝	08:00	27.3 °C	19.8 °C	
	昼	13:00	27.2 °C	27.2 °C	
	夕	17:00	27.1 °C	24.3 °C	
2020/10/13 (火)	朝	08:00	26.4 °C	21.5 °C	
	昼	13:00	25.9 °C	30.1 °C	
	夕	17:00	26.2 °C	22.8 °C	
2020/10/14 (水)	朝	08:00	25.7 °C	17.6 °C	
	昼	13:00	25.7 °C	23.2 °C	
	夕	17:00	25.6 °C	20.3 °C	
2020/10/15	朝	08:00	24.6 °C	16.3 °C	
	昼	13:00	25.0 °C	19.6 °C	
	夕	17:00	24.8 °C	17.4 °C	
2020/10/16 (金)	朝	08:00	24.3 °C	11.1 °C	
	昼	13:00	24.1 °C	20.1 °C	
	夕	17:00	23.9 °C	16.5 °C	
2020/10/17 (土)	朝	08:00	23.5 °C	12.1 °C	
	昼	13:00	23.6 °C	13.3 °C	
	夕	17:00	23.1 °C	10.9 °C	
2020/10/18 (日)	朝	08:00	22.3 °C	10.9 °C	
	昼	13:00	22.0 °C	17.4 °C	
	夕	17:00	21.8 °C	16.0 °C	


コンクリート打込み管理表 (温度計測その2)

○基本情報

路線・河川・地区等	主要地方道 前橋安中富岡線	工期	2020/02/01	~	2021/02/26
工事名	社会資本総合整備 (活力・重点) (分割19号) (仮称) さくら通り橋梁A1工事			工区	
構造物名	さくら橋梁				
構造物詳細	A1橋台	リフト名	2リフト目		

日時	天気	計測時刻	コンクリート温度	養生温度	備考
2020/10/19 (月)	朝	曇り 08:00	21.1 °C	12.1 °C	
	昼	曇り 13:00	20.9 °C	14.2 °C	
	夕	曇り 17:00	20.8 °C	12.9 °C	
2020/10/20 (火)	朝	晴れ 08:00	19.9 °C	9.5 °C	
	昼	晴れ 13:00	19.4 °C	24.0 °C	
	夕	晴れ 17:00	19.8 °C	16.8 °C	
2020/10/21 (水)	朝	曇り 08:00	19.4 °C	13.4 °C	
	昼	曇り 13:00	19.1 °C	20.3 °C	
	夕	晴れ 17:00	19.3 °C	15.8 °C	
2020/10/22 (木)	朝	曇り 08:00	19.1 °C	13.1 °C	
	昼	曇り 13:00	19.1 °C	16.7 °C	
	夕	曇り 17:00	19.2 °C	17.5 °C	
2020/10/23 (金)	朝	雨 08:00	19.0 °C	15.2 °C	
	昼	雨 13:00	18.3 °C	18.4 °C	
	夕	雨 17:00	18.4 °C	17.7 °C	
2020/10/24 (土)	朝	晴れ 08:00	18.6 °C	13.5 °C	
	昼	晴れ 13:00	18.2 °C	21.3 °C	
	夕	晴れ 17:00	18.1 °C	17.2 °C	
2020/10/25 (日)	朝	晴れ 08:00	18.3 °C	11.3 °C	
	昼	晴れ 13:00	17.9 °C	20.6 °C	
	夕	晴れ 17:00	18.0 °C	16.6 °C	
2020/10/26 (月)	朝	晴れ 08:00	18.0 °C	12.5 °C	
	昼	晴れ 13:00	17.7 °C	23.6 °C	
	夕	晴れ 17:00	17.7 °C	16.9 °C	
2020/10/27 (火)	朝	晴れ 08:00	17.8 °C	12.6 °C	
	昼	晴れ 13:00	17.4 °C	21.6 °C	
	夕	晴れ 17:00	17.6 °C	16.9 °C	
2020/10/28 (水)	朝	晴れ 08:00	17.8 °C	13.1 °C	
	昼	晴れ 13:00	17.4 °C	21.4 °C	
	夕	晴れ 17:00	17.4 °C	17.2 °C	

コンクリート温度・養生温度計測結果

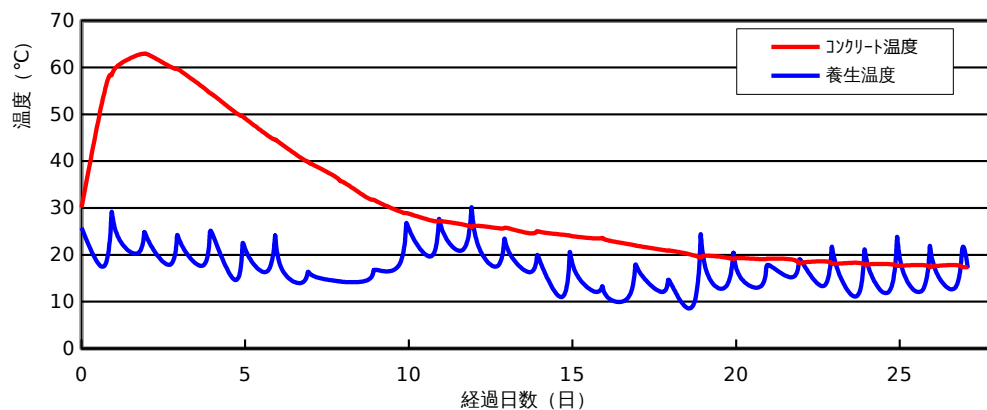

## ひび割れ調査票 (その1)

## ○基本情報

路線・河川・地区等	主要地方道 前橋安中富岡線	工期	2020/02/01	~	2021/02/26
工事名	社会資本総合整備 (活力・重点) (分割19号) (仮称)さくら通り橋梁A1工事			工区	
構造物名	さくら橋梁				
構造物詳細	A1橋台	リフト名	2リフト目		

## ○ひび割れの有無

ひび割れの有無	無
---------	---

## ○ひび割れ概要

## ひび割れ調査票 (その2)

## ○基本情報

路線・河川・地区等	主要地方道 前橋安中富岡線	工期	2020/02/01	～	2021/02/26
工事名	社会資本総合整備 (活力・重点) (分割19号) (仮称) さくら通り橋梁A1工事			工区	
構造物名	さくら橋梁				
構造物詳細	A1橋台	リフト名	2リフト目		

## ○ひび割れ状況

ひび割れ	No.	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11
	位置											
	形状											
	方向											
調査日	2020/12/10											
	2021/01/14											
	2021/01/29											
	2021/02/26											
備考	ひび割れ無し											
補修	補修の有無											
	補修日											
	補修方法											
	備考											

## 設計，施工対比確認表（その1）

## ○基本情報

路線・河川・地区等	主要地方道 前橋安中富岡線	工期	2020/02/01	～	2021/02/26
工事名	社会資本総合整備（活力・重点）（分割19号）（仮称）さくら通り橋梁A1工事			工区	
構造物名	さくら橋梁				
構造物詳細	A1橋台	リフト名	2リフト目		

## ○確実な充填

項目	設計	施工	備考
最小鉄筋間隔	250 mm	250 mm	打込みに影響するもの
最小スランブ	9.5 cm	9.5 cm	設計値/想定値
発注スランブ	12.0 cm	12.0 cm	設計値/実際
流動化剤の後添加有無		無	
打込み時の一時鉄筋移動		無	
コンクリートの施工性		普通	施工者の評価
初期欠陥の有無/程度	豆板	無	有無/程度
	コールトジョイント	無	
	沈みひび割れ	無	
補修の有無/方法		無	有無/方法

## ○ひび割れ抑制

項目	設計	施工	備考	
温度ひび割れ検討	対象外	対象外	対象/対象外	
温度ひび割れ幅の限界値	mm	0.2 mm		
照査方法		山口DB		
条件	打込み時期	10月		
	打込み温度	25		
	外気温	18.5		
	リフト高	m	3.000 m	
	セメントの種類	高炉B種	高炉B種	
	断熱温度上昇特性			
結果	ひび割れ指数			
	最大ひび割れ幅	mm	mm	
	最高温度	℃	62.9℃	
	ひび割れ抑制対策		補強鉄筋	
	補修の有無/方法		無	有無/方法

## ○かぶり（厚さ）の確保

項目	設計	施工	備考
最小かぶり <sup>*1</sup>	84 mm	123.8 mm	
誤差の想定値 <sup>*2</sup>	37 mm	2.3 mm	

\*1：施工は非破壊試験による実測値

\*2：施工は非破壊試験の測定誤差の想定値

## 設計，施工対比確認表（その2）

## ○基本情報

路線・河川・地区等	主要地方道 前橋安中富岡線	工期	2020/02/01	～	2021/02/26
工事名	社会資本総合整備（活力・重点）（分割19号）（仮称）さくら通り橋梁A1工事			工区	
構造物名	さくら橋梁				
構造物詳細	A1橋台	リフト名	2リフト目		

## ○密実性確保

項目	設計	施工	備考
環境条件	一般	一般	
セメントの種類	高炉B種	高炉B種	
水セメント比	55%以下	53.50%	
空気量	4.5%	4.5%	
養生方法	一般養生	ブルーシート	

## ○排水・防水対策

項目	設計	施工	備考
防水対策の有無	無	無	
セメントの種類	高炉B種	高炉B種	
